HERRAMIENTAS ÁGILES PARA REUNIONES

Caleta.

Plataforma de Cobros Internacionales con Liquidación Local para Ecuador

Revisión del Incremento Base de Software — Cierre del Sprint 1

Universidad Espíritu Santo (UEES) • Docente: Marco Vinicio Sotomayor Sánchez

PRODUCT OWNER

Emilio Zúñiga

Visión del producto, Product Backlog, criterios de aceptación y modelo de comisiones.

SCRUM MASTER

Romina Sigcho

Facilitación de reuniones ágiles, diseño UX/UI, aseguramiento del DoD y actas.

BACKEND & PAGOS

Jeickol Moreira

Supabase Auth SSR, RLS en PostgreSQL, triggers atómicos y arquitectura de seguridad.

FRONTEND & DEVOPS

Cristhian Grunauer

Next.js 16, Tailwind CSS v4, Vercel y automatización de CI en GitHub Actions.

El Reto del Freelancer Ecuatoriano y la Solución Caleta

🚫 Stripe no opera en Ecuador

No admite vinculación a bancos ecuatorianos; obliga a profesionales a crear LLCs costosas en EE.UU. o perder contratos.

💸 Altas comisiones en PayPal

Retiene 5.4% + $0.30 por cobro, sumado a pérdidas adicionales en intermediarios informales para retirar el efectivo.


🏦 Tarifas fijas en transferencias SWIFT

Costos bancarios de $25 a $45 USD por giro internacional entrante, inviables para facturas recurrentes de $100 a $500 USD.

PROPUESTA DE VALOR CALETA

Cobra globalmente con tarjeta mediante enlace simple y recibe tus dólares directos en tu banco local en Ecuador (Comisión: 2.1% fija).

MAPEO CONCEPTUAL DEL FLUJO DE FONDOS Y LIQUIDACIÓN



Ceremonias Ágiles y Dinámica Colaborativa en el Sprint 1

PLANNING

Sprint Planning

Planificación y Estimación

- Sprint Goal consensuado por el equipo.
- Estimación por Planning Poker (60h capacidad).
- Desglose de 4 historias (PB-01 a PB-04).

DAILY SCRUM

Daily Scrum

Standup Diario de 15 Minutos

- Sincronización diaria enfocada en 3 preguntas.
- Detección temprana de bloqueos (cookies PKCE).
- Cero reuniones extensas o desenfocadas.

DOD

Definition of Done

Criterios de Calidad Aceptados

- Código en main con Pull Request verificado.
- Pipeline de CI en verde (TypeScript y ESLint).
- Políticas RLS activas en PostgreSQL.

REVIEW & RETRO

Review & Retro

Inspección y Mejora Continua

- Demostración navegable del software ante el PO.
- Retrospectiva con técnica 'Mantener/Mejorar'.
- Acuerdos claros de acción para el Sprint 2.

Historias de Usuario del Incremento: 100% Cumplidas

SPRINT GOAL (OBJETIVO COMPROMETIDO Y ALCANZADO):
“Establecer la base arquitectónica cloud-native, diseño institucional y flujo de autenticación segura tipificada (Persona vs. Empresa).”

PB-01: Landing Page Institucional

✓ COMPLETADO

Est. 12h | Real: 12h

- Propuesta de valor contundente adaptada al mercado ecuatoriano.
- Llamado a la acción directo, diseño mobile-first y navegación ágil.
- Optimización de carga ultra rápida con Server Components de Next.js.

PB-02: Registro Tipificado de Usuarios

✓ COMPLETADO

Est. 16h | Real: 18h

- Segmentación clara: Freelancer (Persona Natural) vs. Empresa (PYME).
- Validación en tiempo real de correos, contraseñas y sanitización.
- Inserción atómica en tabla `profiles` mediante trigger de PostgreSQL.

PB-03: Inicio de Sesión Seguro (Auth SSR)

✓ COMPLETADO

Est. 18h | Real: 18h

- Autenticación con cookies seguras PKCE (Server-Side Auth Supabase).
- Middleware (`proxy.ts`) que bloquea acceso no autorizado a rutas privadas.
- Manejo visual interactivo de errores y feedback de carga al usuario.

PB-04: Recuperación de Contraseña


✓ COMPLETADO

Est. 14h | Real: 12h

- Formulario de solicitud de token de restablecimiento por correo.
- Pantalla de cambio de clave protegida y redirección automática.
- Auditoría de seguridad sin exposición de credenciales en cliente.

Burndown Chart del Sprint 1: Esfuerzo Planificado vs. Real

REGISTRO DIARIO DE ESFUERZO (LÍNEA IDEAL VS. LÍNEA REAL)

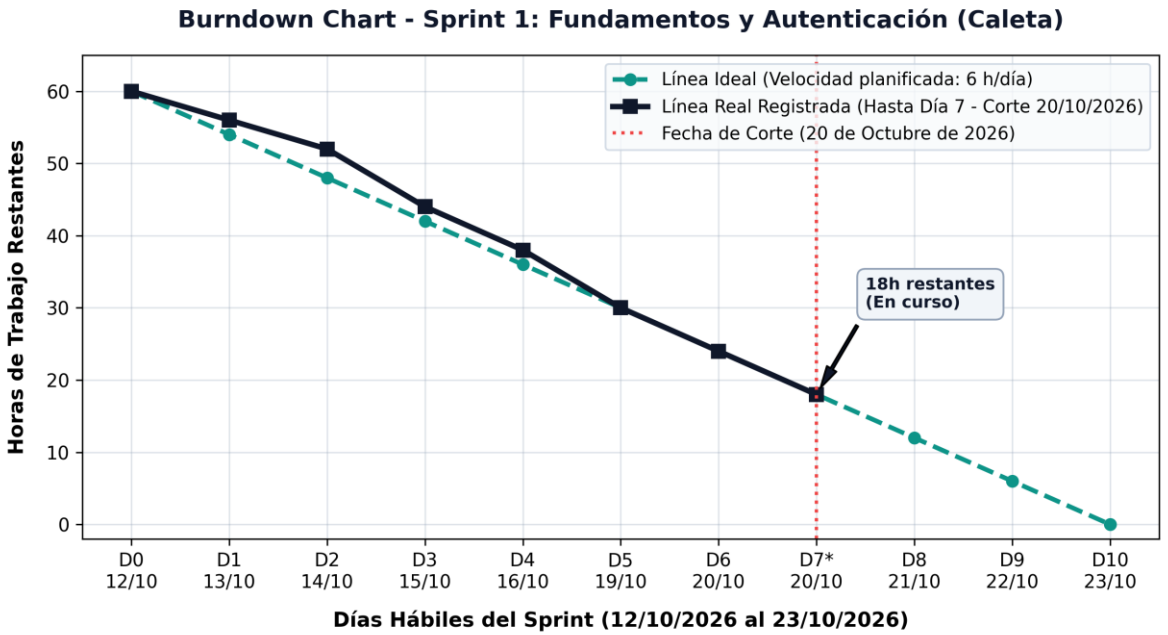

60 HORAS
Capacidad Total


18 HORAS
Restantes Día 7

100%
Criterios DoD

ANÁLISIS DE VELOCIDAD Y AUTOORGANIZACIÓN

- **Comportamiento de la Curva:**
  Los primeros 4 días mostraron una velocidad óptima paralela a la línea ideal de quemado.
- **Bloqueo en Día 5 y 6:**
  La investigación sobre cookies seguras PKCE en Server Components generó una meseta temporal.
- **Capacidad de Autoorganización:**
  El equipo resolvió el bloqueo en el Daily Scrum, acelerando en el Día 7 con 18h restantes.
- **Conclusión:**
  El incremento base se completó sin recortar alcance ni comprometer la calidad del código.

Arquitectura Desacoplada Cloud-Native y Seguridad por Capas

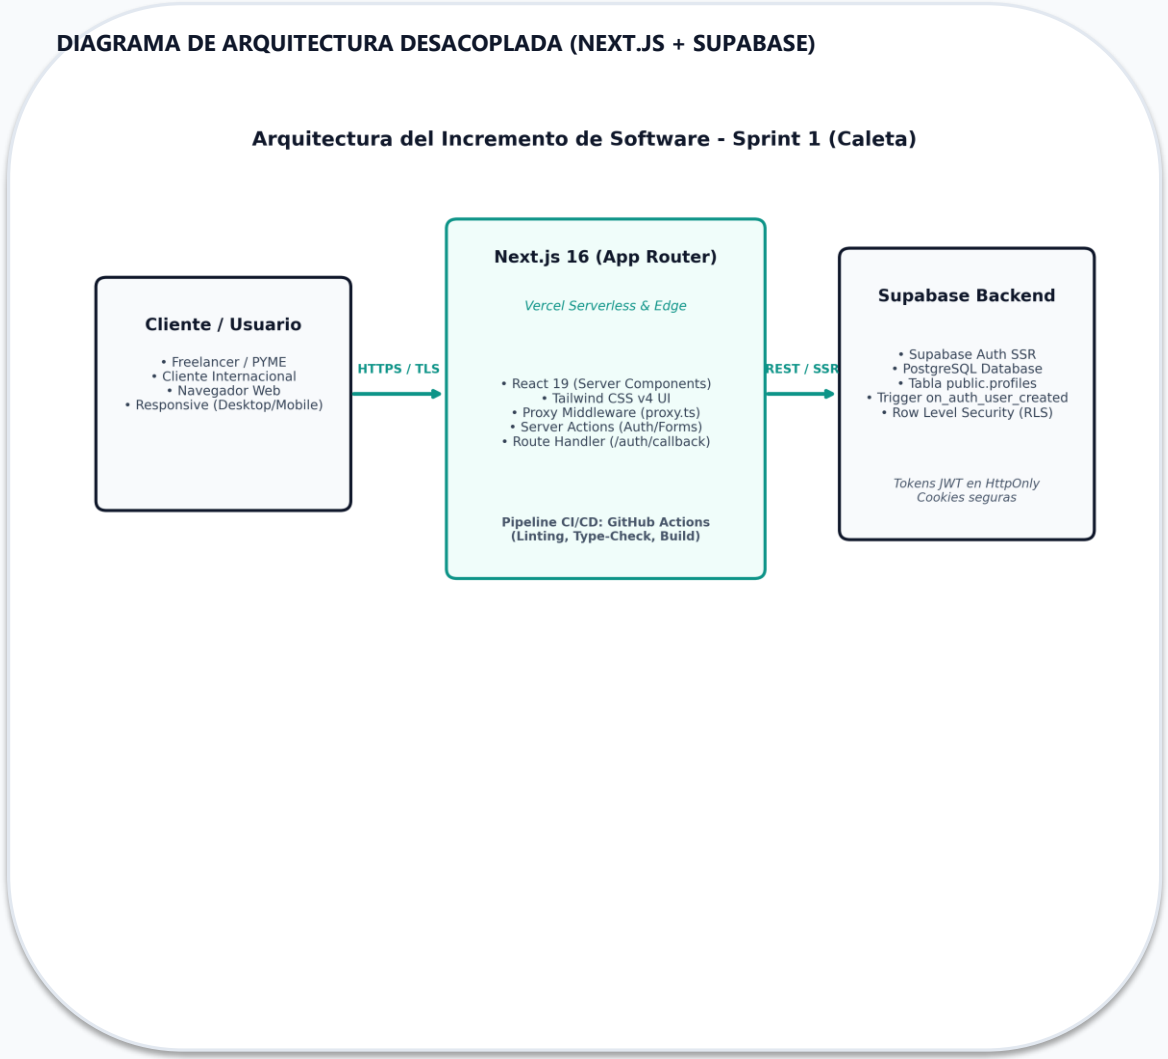

Next.js 16 (App Router & Turbopack)

Arquitectura moderna basada en Server Components para renderizado ultrarrápido y reducción drástica del bundle en el cliente.

Tailwind CSS v4 & Lucide Icons

Sistema de diseño moderno, limpio y responsive adaptado a las guías visuales de plataformas financieras de primer nivel.


Supabase Auth SSR & Cookies PKCE

Autenticación segura en el servidor sin almacenar tokens sensibles en el LocalStorage, mitigando riesgos de XSS.


PostgreSQL RLS (Row Level Security)

Políticas de aislamiento de datos a nivel de motor de base de datos: ningún usuario puede leer ni modificar perfiles ajenos.

Evidencias Visuales del Incremento Base en Funcionamiento

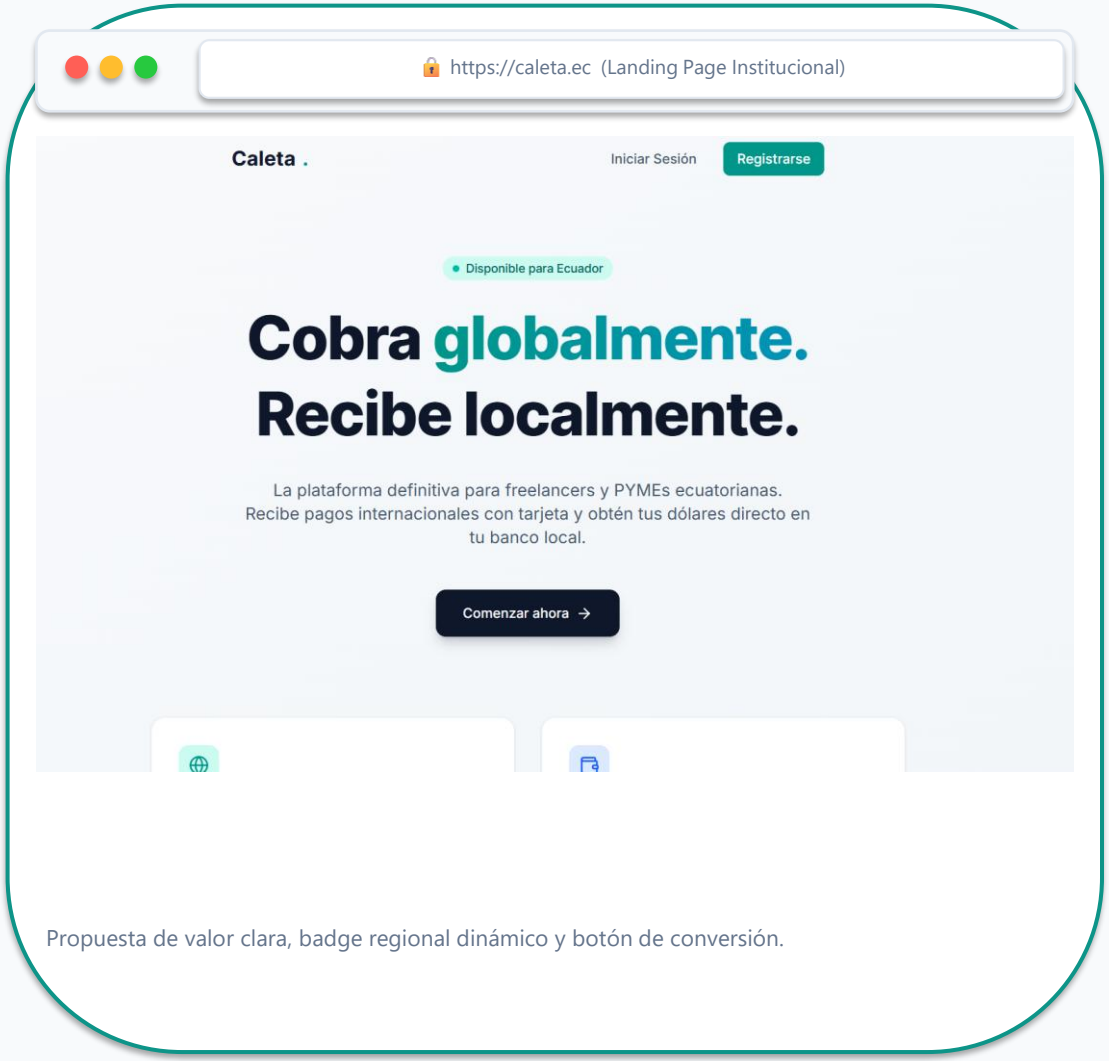

Propuesta de valor clara, badge regional dinámico y botón de conversión.

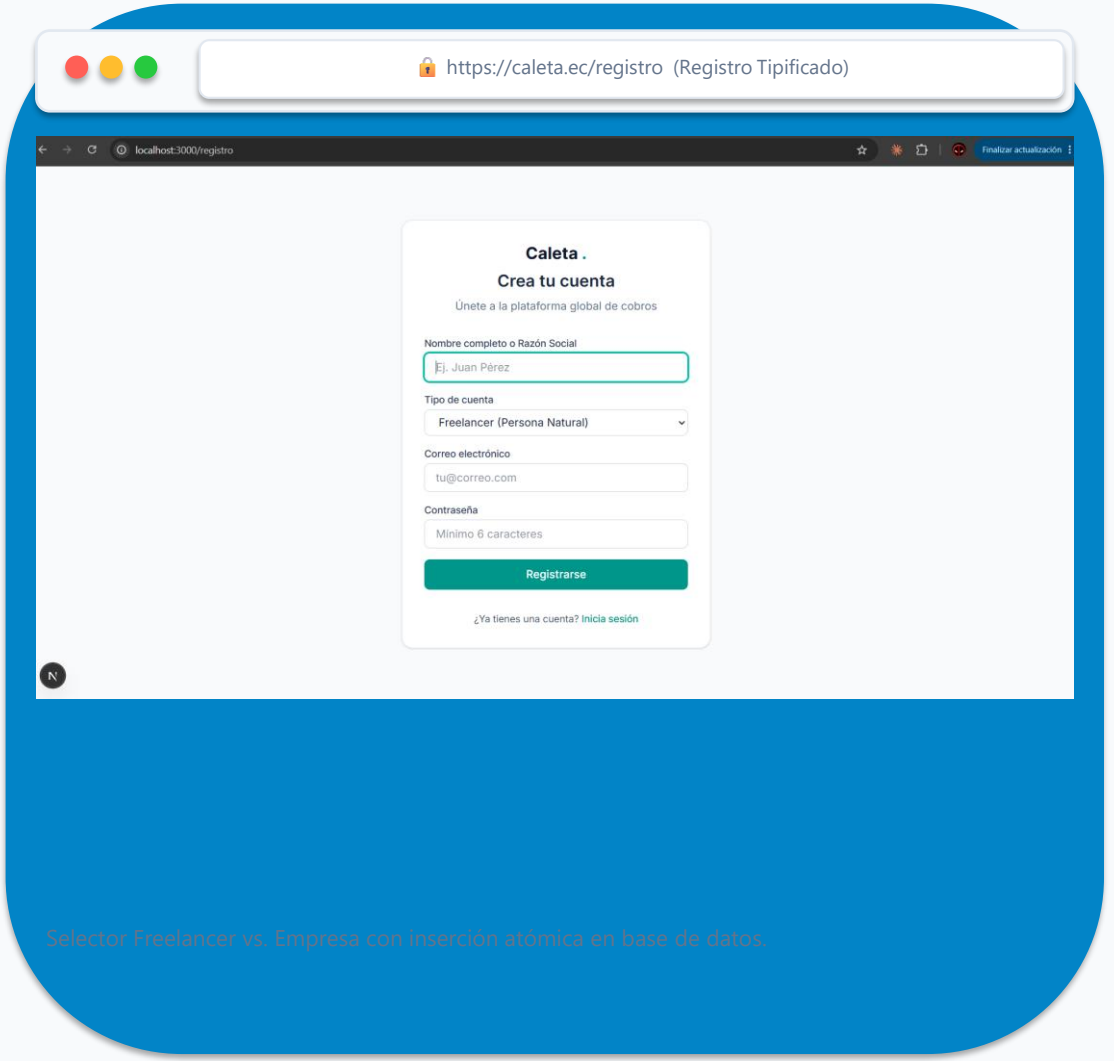

Selector Freelancer vs. Empresa con inserción atómica en base de datos.

Lecciones del Sprint 1 y Próximo Incremento (Sprint 2)

RETROSPECTIVA DE LA REUNIÓN ÁGIL

🌟 Lo que funcionó excelente:

- Integración fluida entre diseño UX y arquitectura backend.
- Automatización del pipeline de CI (cero errores de compilación).
- Standups diarios ágiles de 15 minutos con resolución inmediata.

💡 Oportunidad de mejora:

- Anticipar la curva de aprendizaje en dependencias nuevas (Supabase SSR) al estimar horas de investigación técnica.

🎯 Compromiso para Sprint 2:

- Realizar pruebas de integración documental antes del merge final a producción.

ROADMAP DEL SPRINT 2 (26/OCT – 06/NOV)

PB-05: Verificación Documental KYC / KYB
Subida de cédula, RUC y comprobantes a Supabase Storage con encriptación y permisos restringidos.

PB-06: Gestión de Cuentas Bancarias Locales
Módulo para registrar y validar cuentas de ahorros/corrientes de bancos ecuatorianos para recepción de fondos.

PB-07: Generador de Payment Links
Creación de enlaces de cobro con parámetros dinámicos de monto, descripción y fecha de expiración.

Espacio para Preguntas y Feedback
¡Muchas gracias por su atención! Abrimos el espacio para preguntas y observaciones de la clase.

"Caleta: Cobra globalmente. Recibe localmente." • Fin de la Presentación del Sprint 1
